

'94 상반기
주요업무추진상황

건설도시국

목 차

▣ 기 본 현 황

○ 기 구 및 정 원	1005
○ 주 요 업 무	1006
○ 예 산 규 모	1007
○ 건 설 도 시 행 정 지 표	1008

▣ '94 상반기 업무추진 상황

□ 토지이용의 효율화

1. 토지이용계획의 효율적 관리	1011
2. 청주광역권 개발계획 수립	1012
3. 도시계획 정비	1013

□ 도시가로망 확충.정비

1. 도시 가로망 정비	1015
2. 맑은물 공급대책	1016
3. 하수처리시설 확충	1017
4. 공업단지 조성	1018
5. 택지개발	1019
6. 도시공원 개발	1020
7. 그린벨트내 주민숙원사업	1021

□ 지적업무의 내실화

- | | |
|---------------------|------|
| 1. 지적민원 및 전산운영 | 1023 |
| 2. 부동산소유권이전등기특조법 운영 | 1024 |

□ 주거환경 개선사업

- | | |
|--------------------|------|
| 1. 주택공급 확대 | 1026 |
| 2. 도시영세민 주거환경 개선사업 | 1027 |
| 3. 농촌주거환경 개선사업 | 1028 |

□ 치수 및 재해대책

- | | |
|-------------------|------|
| 1. 재해예방 대책 | 1030 |
| 2. 수해상습지 개선 | 1031 |
| 3. 준용하천정비 기본계획 수립 | 1032 |
| 4. 하천 사유편입토지 보상 | 1033 |

□ 도로망 확충·정비

- | | |
|-----------------|------|
| 1. 도로현황 | 1035 |
| 2. 고속도로 건설 | 1036 |
| 3. 도로 확·포장사업 | 1037 |
| 1) 국도 확·포장사업 | 1037 |
| 2) 지방도 확·포장사업 | 1038 |
| 3) 군도 확·포장사업 | 1040 |
| 4) 농어촌도로 확·포장사업 | 1041 |
| 5) 시,군 보조사업 | 1042 |
| 4. 철도 건널목 개량 | 1044 |
| 5. 노후교량 보수(지방도) | 1045 |

□ 도로관리사업소 운영

1. 기본현황	1048
2. 교통안전시설 정비	1049
3. 지방도 유지보수	1050
4. 충주지소 이전 추진	1051

▣ 지역 현안사업

1. 충주댐광역상수도 사업추진	1053
2. 대청광역상수도 2단계사업	1054
3. 중앙고속도로 건설	1055
4. 중부내륙고속도로 건설	1056
5. 국도4차선 확.포장	1057

▣ 도정 질문중 계속사업 추진상황

1. 청주-보은-상주간 중부내륙고속도로 건설 및 국도4차선 확장	1060
2. 월악산,소백산 국립공원내 집단취락지 불편해소 방안	1062
3. 리라병원앞-공항입구-고속도로까지 4-6차선 계획	1063
4. 교량 안전진단 결과 조치사항	1064

기 본 현 황

□ 기구 및 정원


□ 주요 업무

□ 예산 규모

□ 건설도시 행정지표

기 구 및 정 원

1. 기 구

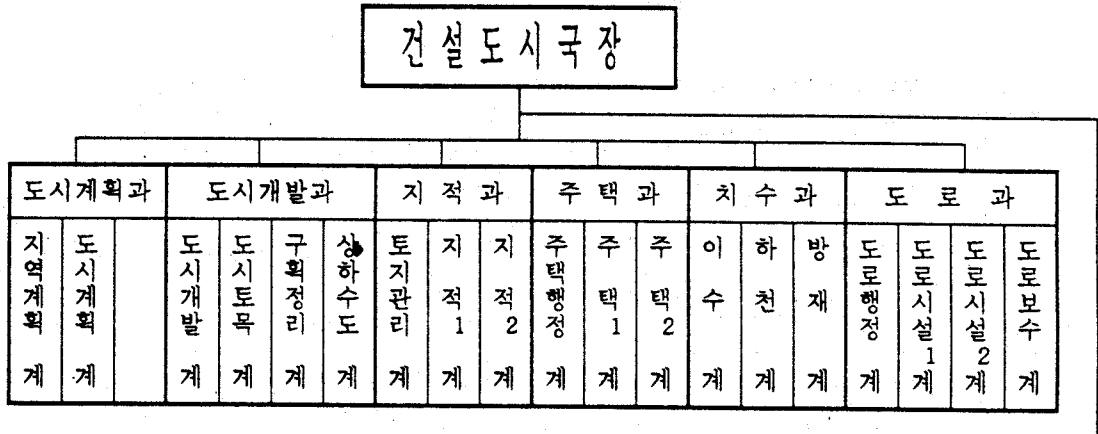

※ 6개과 19계 1 사업소

도로관리사업소			
관 리 과	공 무 과	시 험 실	총지 주소

2. 정 · 현원

('94. 6. 30 현재)

과 별	정 원								현원	결원
	계	일 반 직						기 능 직		
		소계	4 급	5 급	6 급	7 급	8 급			
계	201 명	122	2	28	33	37	22	79	195	6
도 시 계 획 과	16	14	1	3	4	5	1	2	16	
도 시 개 발 과	18	17		5	5	4	3	1	18	
지 적 과	14	12		4	4	3	1	2	14	
주 택 과	14	12		4	3	5		2	14	
치 수 과	20	17		4	3	5	5	3	20	
도 로 과	23	21		5	6	6	4	2	23	
도로관리 사업소	96	29	1	3	8	9	8	67	90	6

※ 결원 기계8급 1 기능5(도로관리사업소)

주요업무

도시계획과

- 국 소관행정 종합계획
- 국토이용계획관리
- 도시계획 결정 및 위원회운영

- 건설부 소관 국유재산 관리
- 중기관리

도시개발과

- 도시계획사업 실시계획승인
- 택지, 공단개발
- 건설업 면허관리

- 도시가로망 정비
- 상하수도, 하수종말처리장
- 국립공원, 도시공원, 개발제한구역, 운천관리

지 적 과

- 토지 관리
- 지적업무 기획조정
- 지적측량 대행법인 감독
- 지적 전산화 및 통계관리

- 지적측량 검사업무 및 토지조사
- 지적공부 관리
- 외국인 토지취급

주 택 과

- 국민주택건설 및 불량주택개량
- 건축업자 및 건축사 지도
- 주거환경 개선사업

- 주택건축 기술보급 및 사업계획 승인
- 농촌 주택개량 지도
- 주택자금 관리

치 수 과

- 치수사업 종합계획
- 재해예방 및 복구

- 하천개수 및 제방 유지관리
- 유도선 운항 지도

도 로 과

- 도로사업 종합계획
- 도로 방재대책

- 도로개설 및 유지관리

도로관리사업소

- 도로 유지 보수관리
- 중장비 운영관리

- 도로사업의 재료시험

94 예 산 규 모

□ 충청북도 예산규모	:	639,000	백만원
○ 일 반 회 계	:	422,851	"
○ 특 별 회 계	:	216,149	"

□ 건설도시국 소관 예산 규모	:	93,305	"	(도예산의 14.6 %)
○ 일 반 회 계	:	93,305	"	(도일반회계예산의 22.0%)
· 도 시 개 발 비	:	21,197	"	
- 도 시 계 획 관 리	:	278	"	
- 도 시 개 발 관 리	:	10,784	"	
- 주 택 기 획 도	:	14	"	
- 건 축 지 도	:	5	"	
- 도 시 경 관 관 리	:	1,803	"	
- 주 택 개 량	:	8,313	"	
· 건 설 사 업 비	:	50,620	"	
- 도 로 건 설	:	8,805	"	
- 도 로 유 지 관 리	:	1,599	"	
- 도로정비양여금사업	:	32,258	"	
- 도로관리사업소 운영	:	7,958	"	
· 치수 및 하수사업비	:	21,469	"	
- 하 천 관 리	:	2,447	"	
- 수질오염방지양여금사업	:	15,597	"	
- 재 해 대 책	:	3,425	"	
· 지 방 수 입 관 리	:	19	"	
- 지 적 관 리	:	19	"	

'94건설행정지표

	'93 말	⇒	'94 말
□ 도시계획정비	33 도시	⇒	39 도시
□ 주택 보급 (천호)	344 (82.7 %)	⇒	363 (83.9 %)
□ 상수도 보급 (천명)	945 (61 %)	⇒	1,000 (62.6 %)
□ 하수도 연장 (Km)	1,430	⇒	1,441
□ 하천개수 (%)	69	⇒	70
□ 공업단지 조성 (만평)	5개단지 218	⇒	7개단지 252
□ 도시공원 조성			
○ 지 정 :	338 개소 42,516 천 m ²	⇒	338 개소 42,516 천 m ²
○ 조 성 :	124 개소 1,136 천 m ²	⇒	124 개소 1,136 천 m ²
□ 도로망 확충			
○ 국 도 (연장 / 포장율)	931 Km 100 %	⇒	931 Km 100 %
○ 지방도 (연장 / 포장율)	829 Km 88 %	⇒	871 Km 93 %
○ 시군도 (연장 / 포장율)	1,148 Km 69 %	⇒	1,264 Km 76 %

’ 94상반기업무추진상황

- 토지 이용의 효율화
- 도시 기반시설 확충 정비
- 지적업무 내실화
- 주거환경 개선
- 치수 및 신 재해대책
- 도로망 확충 정비

토지이용의 효율화

1. 국토의 효율적 이용관리
2. 청주광역시권 개발계획 수립
3. 도시계획 정비

1. 국토의 효율적 이용관리

□ 기본방침

- 국토의 효율적 관리로 토지의 이용을 극대화
- 지역특성과 여건에 맞는 지역개발 촉진

□ 토지이용계획 현황

- 용도지역 조정현황

용도지역	면적	비율	관리방향	법 개정전 용도지역
계	7,436 ㎢	100 %		
① 도시지역	656	8.8	개발위주	도시지역, 공업지역
② 준도시지역	63	0.8		취락지역, 관광휴양지역
③ 농림지역	3,595	48.4	보전위주	개발촉진지역 경지지역, 산림보전지역
④ 준농림지역	2,330	31.3	개발위주	경지지역, 산림보전지역
⑤ 자연환경보전지역	792	10.7	보전위주	자연환경보전지역, 수산자원 보전지역

- 조정 용도지역 관리 : '94. 1. 1 (결정고시 : '93. 12 말 건설부장관)

	'93		'94
· 개발용도지역 :	809 ㎢ (11 %)	→	3,049 ㎢ (41 %)
· 보전용도지역 :	6,627 ㎢ (89 %)	→	4,387 ㎢ (59 %)

- 토지이용 제고를 위한 권한위임 확대('94.5.13)

· 국토이용계획 결정 변경	도지사 30 만㎡ → 100 만㎡ 시장,군수 3 만㎡ → 10 만㎡ ~ 50 만㎡
	(용도지역별 차등)

□ '94 추진실적

- 국토이용계획법령집 발간배포 : 100부('94.3.7)
- 1:5000 국토이용계획도면 정비 : 579도엽 58백만원 : 설계중
- 국토이용계획 업무편람 제작 및 교육 : 7월중

2. 청주광역권 개발계획 수립

기 본 구 상

- 청주를 중심으로한 주변 신개발지역을 2000년대 인구 110 만의 광역도시로 개발
 - 청주과학 산업단지, 신공항, 오송전철역, 부용·현도 공단등
- 도시별 인구와 산업의 적정배치로 쾌적하고 편리한 이상적 계획도시 개발
 - 청주 : 행정, 교육, 문화중심 도시
 - 청주과학산업단지, 부용, 현도, 증평 : 첨단산업 중심도시
 - 신공항, 오송 : 정보통신산업 및 교통중심도시
- 도시와 주변도시간 광역 도시기반시설 확장, 정비

□ 개발권역 : 청주시, 증평출장소, 청원군 12개면 (715.2 km²)

□ 추진일정

- 기본구상 수립 용역
 - 용역기관 : (주)동명기술공단, 대한국토도시계획학회, 충북대학교지역개발연구소
 - 용역비 : 325 백만원
- 국토이용계획변경 및 오송신도시 기본계획수립 : '95 이후
- 신도시 시설계획 수립 : '95 년도
- 사업추진 : '96 - 2016 년

□ 추진실적

- 현공정 : 72 %
- 보고회 개최
 - 중간보고회 : 7월 하순경
 - 시군 주민보고회 : 8월중 개최예정

3. 도시계획 정비

□ 추진 방향

- 도시여건 변화의 능동적 수용
- 안전하고 체계적인 도시발전 유도

□ 정비 대상

구 분	대상도시	도시계획 수립도시	행정구역 면 적	도시계획 구역면적	도시계획 구역인구
계	46 도시	46 도시	3,505.42 ㎢	636.81 ㎢	977,870 명
시 지 역	3	3	345.79	379.11	739,052
읍 지 역	10	10	674.72	103.32	146,819
면 지 역	33	33	2,484.91	154.38	91,999

□ 추진 계획

구 분	계		도시기본계획 변		도 시 계 획 재 정 비		도시계획용도 지역시설변경	
	'94 계획	실적	'94 계획	실적	'94 계획	실적	'94 계획	'94 실적
계	17건	14건	-	-	16	5	1	9
시 지 역	1	5	-	-	-	-	1	5
읍 지 역	2	5	-	-	2	1	-	4
면 지 역	14	4	-	-	14	4	-	-

□ 기대 효과

- 건전하고 체계적인 도시발전으로 공공복리 증진
- 도시계획 시설정비로 민원 해소

도시기반시설 확충·정비

1. 도시간로망 정비
2. 맑은물 공급대책
3. 하수처리시설 확충
4. 공업단지 조성
5. 택지개발
6. 도시공원 개발
7. 그린벨트내 주민숙원사업

1. 도시가로망 정비

□ 추진방침

- 우회도로망 우선구축
- 주거 밀집지역의 소방도로 개설
- 주민숙원사업 우선 해결

□ 사업개요

- 대 상 : 3개시
- 총연장 : 1,101 Km
- 기개설 : 663 Km
- 개설율 : 60.2 %

□ 추진계획

(단위 : Km, 억원)

시 별	총 계 획		기 시 행		'94 계 획		추진실적	
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	진도	추진내용
계	1,101.0	52,439	663.0	32,010	5.1	259	10	착공 17개소
청주시	590.0	30,387	397.0	20,445	1.5	108	10	착공 8개소
충주시	293.0	14,044	161.0	7,712	2.3	80	10	착공 4개소
제천시	218.0	8,008	105.0	3,853	1.3	71	12	착공 5개소

□ 기대효과

- 도심지 교통난 해소
- 주민숙원사업 해결
- 지역 균형발전 도모

2. 맑은물 공급대책

□ 추진방침

- 급수난 우심지역 우선시행으로 주민생활불편 해소
- 정수방법 및 시설개량으로 맑은물 공급
- 철저한 공사감독 및 품질관리로 완벽한 시공

□ 사업개요

- 상수도 보급 도시 : 53 개소 (3 시 10 읍 40 면)
- '94 사업 도시 : 45 개소 (3 시 9 읍 33 면)
 - 취·정수시설 : 19 개소 (개량 18, 확장 1)
 - 송·배수관로 : 90.02 km

□ 사업계획

(단위 : 백만원)

구 분	'94 계 획		추진 상황	
	사 업 량	사 업 비	진 도	추진 내용
계	45 개소	25,533	43 %	
맑은물 공급	노후관개량 54.01km	13,927	30	13.75 km 완료
	취정수개량 18 개소		46	10 개소 추진중
누수방지	누수탐사 40,930 전	786	90	23,570 전 완료
	계량기교체 9,016 개		41	3,669 개 교체
시설확장	취정수시설 1 개소	10,820	15	1 개소 추진중
	송배수관 36.01km		52	15.7 km 완료

□ 기대효과

- 급수도시확대 : 53 개소(3 시 10 읍 40 면) → 57 개소(3 시 10 읍 44 면)
- 급수인구확대 : 855 천명(보급율 60 %) → 1,000 천명(보급율 62.6 %)

3. 하수처리시설 확충

- 하 수 관 거 정 비 : 12 km
- 하 수 종 말 처 리 장 : 4 개소 (224 천톤/일)
 - 한 강 수 계 : 2 개소 (64 ")
 - 금 강 수 계 : 2 개소 (160 ")

□ 투자계획

○ 하수도 시설

(단위 : km, 억원)

총 계		기 시 행		'94 계 획		추 진 상 황	
사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	진 도	추 진 내 용
3,141	5,258	2,017	1,541	12	46	43 %	3.3 km 완료

○ 하수종말처리장 건설

(단위 : 억원)

구 분		시설용량	사업기간	총사업비	'94 계 획		추 진 상 황	
					사 업 비	총진도	진도	
계 (4개소)		224천톤/일	'90-'96	1,184	256	41 %	19 %	
한강수계	충 주	50	'90-'94	284	129	준 공	76	시설물공사
	수안보	14	'92-'95	145	62	52	3	충주와연계 검토중
금강수계	청 주	130	'93-'96	490	52	13	1	실시설계중 (80 %)
	중 평	30	'93-'96	265	13	실 시 설 계	1	실시설계중 (50 %)

□ 기대효과

- 상수원 수질개선
- 수질보전을 위한 쾌적한 생활환경 조성

4. 공업단지 조성

□ 추진방침

- 상대적 낙후지역 개발로 지역간 균형개발 기여
- 저공해성 공장유치로 자연환경오염 최소화
- 주민의견 적극수렴으로 민원발생 사전예방

□ 사업개요

○ 대 상 : 16개단지 5,120천평

기 조 성	: 5 개단지	2,180 천평
조 성 중	: 9 "	2,320 "
향 후 계 획	: 2 "	620 "

□ 추진계획 및 실적

(단위 : 천평, 억원, %)

구 분	단지명	시 행 자	면 적	사 업 기 간	총 사업비	공 정		추진실적
						6월말 (실적)	12월 (계획)	
	계	11단지	2,932	86 - 98	3,561	59	63	※ 누계공정임
조 성 중	충주 2	충 주 시	317	91 - 95	507	40	67	· 1단계 공사완료
	보 은 한 화		1,218	86 - 96	466	80	85	· 기반시설공사중
	부 용 청 원 군		171	90 - 95	326	87	90	·
	현 도 진 로		212	91 - 94	416	98	100	· 북측진입도공사중
	대 풍 음 성 군		131	91 - 94	363	90	100	· 마무리공사중
	육 육 오 성 화 학		95	92 - 95	85	15	25	· 실시계획승인
	금 암 영 육 농 산		41	92 - 95	32	5	20	· 실시설계중
	음 성 니 트 조 합		35	93 - 95	43	15	20	· 실시계획승인
	괴 산 미 지 정		100	93 - 96	177	5	20	· 지구지정협의중
	왕 암 "		439	94 - 98	646	-	10	· 지구지정중
	금 왕 "		173	94 - 97	500	5	10	· 지구지정협의중

5. 택지개발

□ 추진 방침

- 택지개발로 내집마련 촉진
- 주거생활안정과 복지생활 향상에 기여
- 주민의견 적극 수렴으로 민원발생 사전예방

□ 사업 개요

○ 대 상 : 41 개지구 5,976 천평

기	개	발	29개	지구	3,612	천평
개	발	중	7	"	1,039	"
계	획	중	5	"	1,325	"

□ 추진계획 및 실적

(단위 : 천평, 억원, %)

구 분	지구명	시 행 자	면 적	사업기간	총 사업비	공 정		추진실적
						6월말 (실적)	12월 (계획)	
계		14 지구	3,014	'90-'98	19,974	22	27	※ 누계공정임
개 발 중 분 평	소 계	8 "	1,308	'90-'98	7,877	60	77	
	가경 3	공 개 단	219	'92-'96	1,540	10	20	· 실시계획협의중
	산남 2	청 주 시	107	'92-'95	724	60	90	· 기반시설공사중
	청전 2	제 천 시	70	'92-'95	300	60	80	· " "
	무 국	음 성 군	19	'92-'94	56	90	100	· 공사완료
	용 암	토 개 공	377	'90-'96	2,275	88	100	· 마무리공사중
	금 능	"	208	'91-'95	1,052	65	80	· 기반시설공사중
	하 소	주 택 공	39	'91-'94	154	90	100	· 마무리공사중
	분 평	"	269	'93-'98	1,776	7	20	· 실시계획협의중

6. 도시공원 개발

□ 추진방침

- 시·군 재정에 따라 시급한 공원 우선 조성
- 공원조성으로 도시민의 건강, 정서함양에 기여
- 민자유치로 편익시설 유치

□ 도시공원현황

- 공원수 및 공원면적 ————— 338 개소, 42,516천㎡ (14 시·군·출장소)
- 조성 공원수 및 조성 면적 ——— 124 “ , 1,136 “

□ 추진상황

(단위 : 천㎡, 백만원)

사업명	위치	시행자	추진 기간	사업 비	'93까지 실적		'94 계획		추진내용
					사업량	사업비	사업량	사업비	
장락제1공원	제천시 장락	제천시	92~94	4,326	19	490	도서관 1동	1,210 95이후 2,626	토목 50% 건축준비중
충혼탑원 공	진천군 진천	진천군	93~94	350	47	200	1개소	150	공정 100%
도도자공 담시연원	단양군 단양포	단양군	93~94	1,700	3	200	상가 조성	1,500 (지역 개발 기금)	토지매입 완료 100% 면적: 2.91 사업비: 247.8 '93년도 지 역개발기금 신청 부결 에 따라 추 후 예산확 보후 개발 예정

7. 그린벨트내 주민숙원사업

□ 현 황

- 면 적 : 236.7 ㎢ (전국대비 4.4 %)
 - 청주권 : 180.1 ㎢
 - 대전권 : 56.6 ㎢
- 가구 및 인구 : 9,133가구 34,562명

□ 추진계획

(단위 : 백만원)

사 업 명	총 계		기 투 자		'94 계 획		추진실적	
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	진도	추진내용
계 27개소		6,265		1,400		750		
마을안길 진입로 포장	L=63.7km W=3~5 m	5,437	L=18.0 W=3~5	1,355	L= 6.2 W=3~5m	508	90	공사완료 및추진중
하수구 정비	L= 2.9km	179	L=0.75	34	L=0.3	32	100	공사완료
소하천 정비	L= 3.3km	312	L=0.15	11	L=0.06	18	100	공사완료
소교량 가설	L= 219m W=2~5 m	187	-		L=28	42	70	콘크리트 포설중
팔절~북일입 상 도로포장	L=1.2km W=5.0m	150	-		L=1.2km W=5 m	150	50	토공중

□ 기대효과

- 낙후된 생활환경 개선
- 지역주민 불편 해소

지적업무의 내실화

1. 지적민원처리 및 전산운영관리

2. 부동산소유권이전등기특조법 운영

1. 지적민원처리 및 전산운영 관리

□ 기본방침

- 신속 정확한 민원처리
- 지적측량검사 철저
- 지적전산 운영 체제확립 및 완벽한 자료관리

□ 추진실적 ('94.5.31 현재)

(단위 : 천필)

구 분		계 획	실 적	비 율	비 고
계		5,550	3,304	59.5 %	
민 원 처 리	소 계	1,580	868	54.9	
	열람및등본발급	1,450	794	54.8	
	토지이동정리	80	53	66.3	
	지적측량검사	50	21	42.0	
전 산 관 리	소 계	3,970	2,436	61.4	
	변동자료정리	1,470	1,250	85.0	
	자 료 제 공	2,500	1,186	47.4	

□ 기대효과

- 주민편익 위주의 민원처리로 주민불편사항 해소
- 전산입력자료의 완벽한 관리와 정확한 토지정책 자료제공

2. 부동산소유권이전등기특별조치법 처리

— 등기와 권리불일치, 미등기부동산 소유권 일치 —

□ 기본 방침

- 등·리별 보증인의 위·해촉 관리철저
- 처리절차 및 기간을 준수하여 최단기간내 처리
- 부당한 보증으로 인한 이의신청 또는 소 제기등 민원발생 방지

□ 사업개요

- 시행기간 : '93. 1. 1. ~ 94. 12. 31 (2년간)
※등기신청은 '95. 6. 30까지 가능
- 적용대상 : '85. 12. 31 이전에 매매·교환·증여·상속 등 법률행위로 사실상 양도된 부동산 및 미등기 부동산
- 적용지역
 - 시지역 : 농지·임야 및 ㎡당 공시지가 60,500원이하의 모든토지(인구 50만이상 시 제외)
 - 군지역 : 모든 토지 및 건물
- ※ 토지·임야대장에 등록된 토지와 건축물대장에 등록되어 있는 건축물

□ 추진실적

('94. 5. 31현재)

목표량	확 인 서 발 급				홍 보			보증인
	계	토 지	건물	비율	계	TV,반회보	마을ئم프등	위 촉
106천필	77,365필	76,797	568	73%	1,659회	50	1,609	6,629명

□ 기대효과

- 주민의 시간적 경제적 부담 절감
- 토지소유권 보호 및 효율적인 토지관리

주거환경 개선

1. 주택공급 확대
2. 도시영세민 주거환경 개선사업
3. 농촌주거환경 개선사업

1. 주택공급 확대

□ 사업 개요

(단위 : 호)

구 분	94건설계획	당 초	증 감	비 고
총 계	23,215	19,000	4,125	
공 공 부 문	8,336	5,674	2,662	
민 간 부 문	14,789	13,326	1,463	

□ 추진 방침

- 부실시공 방지대책의 추진으로 건설한 주택건설 공급
- 무주택 서민의 내집 마련을 위한 소형 공동주택 건설
- 공공임대 및 근로자주택 건설로 저소득층 주거안정 도모

□ 상반기 추진실적

구 분	계 획	실 적	비 율 (%)	비 고
총 계	23,215	6,235	26.8	
공 공 부 문	8,336	1,796	21.5	
민 간 부 문	14,789	4,439	30.0	

2. 도시영세민 주거환경 개선사업

□ 사업목적

- 도시저소득주민의 열악한주거환경 개선으로
- 편리하고 쾌적한 주거환경 조성

□ 사업개요

- 대 상 : 3개시 29개지구 366건 44,275백만원
- 사업기간 : '89 - '97
- 기개선('89 - '93) : 18지구 253건 29,111백만원
- '94 계획 : 3지구 29건 4,716백만원
- '94 이후 : 8지구 84건 10,448백만원

□ 상반기 추진실적 (지구별 내역)

단위 : 백만원

시 별	지구명	사 업 규 모		사업비	추진상황	진도	비고
		건수	사업량				
합 계	3지구	29		4,716			
청주시	금 천	7	소방도로 개설 340m외 3중	1,691	· 지장물 철거 · 공사착공	60%	
충주시	칠 금	17	소방도로 개설 760m 외 4중	1,886	· 감정의뢰 완료 · 공사계약 추진중	40%	
제천시	화 산	5	소방도로 개설 200m외 3중	1,139	· 지장물 철거 · 공사착공	60%	

3. 농촌주거환경 개선사업

□ 사업의 필요성

- 농.어촌 주민의 정주의욕 고취 및 농.어촌 주택구조개선
- 깨끗하고 편리하게 정비된 기반시설 완비

□ 사업개요

('94. 6. 30. 현재)

구 분	단 위	총 사업량	기 개 량	'94 계획	향후계획	비 고
주 택 개 량	동	61,924	27,072	1,040	33,812	
취락구조 개선	마 울	490	333	7	150	
변 소 개 량	동	53,764	32,010	4,000	17,754	
오수처리 시설	개 소	128	6	7	115	
부엌.욕실 개량	가 구	36,862	17,228	4,000	15,634	
변 기 개 량	개	42,179	17,500	6,000	18,679	

□ '94 추진상황

(단위 : 백만원)

구 분	단 위	사업량	사업비	진 도	추 진 내 용
계		6 개사업	23,940	54 %	
주 택 개 량	동	1,040	16,640	67	○ 완공: 442동.공사중: 415동
취락구조 개선	마 울	7	560	46	○ 완공: - .공사중: 7마을
변 소 개 량	동	4,000	2,000	59	○ 완공: 1,530동.공사중: 1,547동
오수처리 시설	개 소	7	500	14	○ 완공: 1개소.공사중: 4개소
부엌.욕실 개량	가 구	4,000	4,000	78	○ 완공: 2,603동.공사중: 1,043동
변 기 개 량	개	6,000	240	60	○ 완공: 3,591개.

치수 및 신재해 대책

1. 재해예방대책 추진
2. 수해상습지 개선
3. 준용하천정비 기본계획 수립
4. 하천 사유편입토지 보상

1. 재해 예방대책 추진

□ 추진방침

- 피해우려 지역 사전정비
- 완벽한 시공 및 우기전 마무리 주민 불안 해소

□ 사업개요

- 기성제 유지보수 : 16 개소 2,600 m
- 제방보수 : 13 " 2,600 "
- 수 문 : 3 " (권양기식 → 편책식으로 교체)
- 하상정리 및 수목제거 : 10개 시군
- 재해 위험지구 정비 : 5개 시군 1,500 m

□ 추진계획

(단위 : m, 백만원)

사 업 명	' 94 계 획			추진 실적		비 고
	개소수	사 업 량	사 업 비	진 도	추진 내용	
계	31	4,100	1,191	73 %		
기성제 보수	13	2,600	396	99	증평 사곡제 60%	
수 문 보수	3	-	100	100		
하상정리 및 수목제거	10	-	95	100		
재해위험지구	5	1,500	600	47	도집행 4개소:완료 충주안림제 : 10 %	

※ 도비 : 900백만원, 시군비 : 291백만원

□ 기대효과

- 주택보호 : 190 동
- 농경지 보호 : 456 ha

2. 수해상습지 개선

□ 추진방향

- 상습 침수지역 개선으로 재해예방
- 완벽한 공사추진

□ 사업개요

- 사업량 [지구수 : 18 개소
연 장 : 84.6 km
- 투자액 : 25,366 백만원
- 사업기간 : '88 ~ '95

□ 추진계획

(단위 : km, 백만원)

사업명	기시행		'94 계획		추진 실적		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비	진도	추진내용	
계	15/71.1	20,649	8/ 9.1	3,858	44 %		
수해상습지개선	(82%) 11/68.9	19,549	(9%) 4/ 7.5	3,108	41	축제 및 구조물 호안블럭	
일반 하천 개수	4/ 2.2	1,100	4/ 1.6	750	46	축제 및 구조물 호안블럭, 돌망태	

※국비 2,580 도비 1,278백만원

□ 기대효과

- 재해사전 예방으로 주민 재산보호 [가옥보호 : 171 동
농토보호 : 1,522 ha
- 안정된 생활기반 조성및 국토 보전

3. 준용하천정비 기본계획 수립

□ 추진방향

- 효율적인 국토관리
- 일관성 있는 개발계획 수립

□ 사업개요

- 사업량 : 개소수 : 166 개소
연장 : 1,863.2 km
- 투자액 : 5,462 백만원
- 사업기간 : 1991 ~ 2000 년

□ 추진계획

- 총 계 획 : 166 개소 1,863.2 km 5,462 백만원
- 기 수 립 ('93까지) : 16 " 274.1 " 695 " (15 %)
- '94 계 획 : 6 " 100.0 " 300 " (5 ")
- 향 후 계 획 : 144 " 1,489.1 " 4,467 "

□ '94 추진실적

(단위 : km, 백만원)

사 업 명	하 천 별	사 업 량	사 업 비	추진실적	
				진 도	추진내용
계		84.0	300	20	
쌍 천	준 용	23.5	81	30	측량 및 수질검사완료
요 도 천	"	18.5	64	34	"
덕암·목방천	"	12.0	43	28	"
영 동 천	"	8.0	30	10	하천측량중
삼 봉 천	"	9.0	36	0	집행의뢰(회계과)
웅 천	"	13.0	46	10	하천측량중

□ 기대효과

- 하천의 기본자료 제공 및 하천자원 활용제고

4. 하천 사유편입토지 보상

□ 추진방향

- '86 - '90 까지 청구된 토지보상
- '86 - '95 까지 년차적 보상 (10년 계획)

□ 사업개요

- | | | | | |
|-------------|---|----------|------------------------|----------|
| ○ 총 보 상 대 상 | : | 4,301 필지 | 5,421 천 m ² | |
| · 기 보 상 | : | 2,912 " | 3,571 " | (65 %) |
| · '94 계 획 | : | 246 " | 359 " | (65→72%) |
| · 미 보 상 | : | 1,143 " | 1,491 " | (28 %) |

□ 추진계획

(단위 : 천㎡, 백만원)

구분		보상대상		기보상		'94 계획		추진실적		진도 %
		면적	금액	면적	금액	면적	금액	면적	금액	
하천										
계		5,421	11,982	3,571	5,059	359	992	277	634	64
직할하천	소계	3,050	6,986	1,881	2,279	80	207	22	36	17
	국비	2,128	4,656	1,373	1,519	29	138	3	16	11
	지방비	922	2,330	508	760	51	69	19	20	29
지방하천		2,371	4,996	1,690	2,780	279	785	255	598	76

※ 재 원 : 직할하천 [국비 2/3 지방하천 : 도비 100 %
도비 1/3]

□ 기대효과

- 사유재산권 보호로 민원해소
- 효율적인 하천관리

도로망 확충.정비

1. 도로망 확충정비
2. 고속도로 건설
3. 도로 확.포장
 - 1) 국도 확.포장
 - 2) 지방도 확.포장
 - 3) 군도 확.포장
 - 4) 농어촌도로 확.포장
 - 5) 시,군 보조사업
4. 철도건널목 개량
5. 노후교량 보수(지방도)

1. 도로망 확충 정비

(단위 : KM, 억원)

구 분	사 업 량		사 업 비	시행청	추진실적	
	로선수	연 장			진도	추진내용
총 계	110	261.6 ^{km}	3,920		40 [%]	
○ 중앙고속도로 (충북구간)	1	280.0 (60.0)	2,400	건설부	24	
. 1단계		151.0 (9.9)	2,050		63 (86)	토공및구조물공사 중
. 2단계		129.0 (50.1)	350		-	용지보상중
○ 일 반 국 도	10	20.6	579	"	25	
. 4 차 선	9	20.4	551		25	교량및터널토공사 중
. 우회도로	1	0.2	28		15	하천복개하부공사
○ 지 방 도	25	24.7	310	도	33	토공및구조물공사 중
○ 시 군 도	40	116.0	534	군	30	"
○ 농 어 촌 도로	34	40.3	97	"	35	"

2. 고속도로 건설

□ 건설부 시행 : 국비사업

(단위 : km, 억원)

사 업 명	총 계		기 시 행		'94 계 획		추 진 실 적	
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	진도	추진 내용
□ 중앙 고속도로 (충북구간)	280.0 (60.0)	33,192		5,706		2,400		
○ 1 단 계 (충북구간)	151.0 (9.9)	14,535	토공및 구조물	5,606	토공및 구조물	2,050	63% (86)	토공및구조물 공사중
· 대구~안동	87.0							
· 제천~원주	38.0							
(충북구간)	(9.9)							
· 홍천~춘천	26.0							
○ 2 단 계 (충북구간)	129.0 (50.1)	18,657	용지보 상	100	보상및 착공	350		용지보상중
· 안동~영주	25.5							
· 영주~제천	60.7							
(충북구간)	(50.1)							
· 원주~홍천	42.8							
□ 중부내륙 고속도로 (충북구간)	234.7 (106)	13,785	실시설 계81.8	74	-	-	-	
○ 여주~충주 ~구미 (충북구간)	154.0 (64.0)	7,238	실시설 계68.4	54	-	-	-	사업기간 '97 - 2004
○ 청주~보은 ~상주 (충북구간)	80.7 (42.0)	6,547	실시설 계13.4	20	-	-	-	사업기간 미확정

3. 도로 확 · 포장 사업

(1) 건설부 시행 : 국비사업

[단위 : km/억원]

구 분	전 체		기 투 자		'94 계 획		추 진 실 적	
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	진도	추 진 내 용
합 계	9건/ 78.7 교량 9	3,116	확18.7 포 1.0 교 1	701	확20.6 포 8.7 교량 4	579	24.9	
○ 4차선 사업	8/73.7 교량 9	3,014	확13.9 포 1.0 교량 1	627	확20.4 포 3.7 교량 4	551	25.4	
○ 충주 - 봉양	4/29.5 교량 2	1,533	확 8.1 교량 1	356	확 2.3 교량 1	152	43.0	
충주 - 송강	10.5 교량 2	331	확 1.8 교량 1	83	확 2.2 교상부	76	23.0	토공작업중 목행교 하부공사
송강 - 백운	8.8	569	-	-	-	-	-	실시설계미착수
백운 - 연박	6.4 터1.96	463	확 6.3 터1.85	273	확 0.1 터 1.1	76	63.0	박달재2차선굴진 터널 내부공사중
연박 - 봉양	3.8	170	-	-	-	-	-	실시설계 용역중 (94. 5. 6-12.31)
○ 옥천 - 영동	2/26.7 교량 3	914	확5.8 포1.0	253	확11.9 포 3.7 교량 3	296	23.5	
옥천 - 고당	17.0	565	확 2.9	123	확10.0 포 1.5	186	25.0	토공 작업중 소교량 상부공사
고당 - 영동	9.7 교량 3	349	확 2.9 포 1.0 교하부	130	확 1.9 포 2.2 교상부	110	20.0	토공 작업중 양강교 상부공사
○ 충주 - 수안보	2/17.5 교량 4	567	보상	18	확 6.2	103	5.9	
충주 - 상모	9.5 교량 2	260	보상	9	확 3.2 교하부	49	7.0	토공 작업중 교량 하부공사
상모 - 수안보	8.0 터0.63 교량 2	307	보상	9	확 3.0 육교	54	5.0	토공 작업중 구조물 공사
○ 영동 우회도로	1/ 5.0	102	확 4.8	74	확 0.2 포 5.0	28	15.0	하천복개하부공 사(L = 240M)

(2) '94 지방도 확, 포장 사업계획

□ 도시행사업

(단위 : km, 백만원)

사 업 명		전 체		기 투 자		'94 계 획		추 진 실 적	
		사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	진도	추 진 내 용
합 계		26/ 253.3	213,584 (216,298)	확140.3 포102.0	62,441 (63,761)	확24.7 포38.5	30,952 (32,346)	33%	26개소중 23개소 착공
4차선	소 계	2/ 33.4	88,000		4,995	확 5.0 교 3.0	7,310	-	국도승격예상 으로시행보류
	두산 ~미원	13.2	30,000	보상 6.8	2,115	확 1.5 교 2.0	3,810	-	"
	음성1.C ~오생	20.2	58,000	보상 1.8	2,880	확 1.0 교 1.0	3,500	-	"
장대교 및 위협교량	소 계	4 건	11,530 (14,244)		1,530 (2,850)		5,200 (6,594)	15	4개소중 4개소 착공
	남한강 대교	도 1.3 교 480M	3,230 (5,744)	보 상 교하부	1,530 (2,850)	포 1.3 교상부	1,700 (3,094)	55	교각 공사중
	쌍청교	교 량 297 M	3,200	-	-	교량 하 6기	1,300	15	현장사무실 가설
	호탄교	교 량 300 M	3,900	-	-	교량 하 9기	1,000	15	현장사무실 가설
	미호교	교 량 432 M	1,200	-	-	교 량 432 M	1,200	15	현장사무실가 설(충남시행)
2차선	소 계	20/ 220.9	114,054	확140.3 포102.0	55,916	확22.2 포38.5	18,442	35	20개소중 19개소 착공
	청주 ~미원	12.0	6,856	확 1.3 포 0.9	692	확 2.4 포 0.4	1,300	23	토공
	육산 ~가좌	7.2	3,050	확 7.2 포 4.3	2,617	포 2.9	433	70	포장준비
	회남 ~문의	10.9	6,384	1.0	584	1.0	700	30	표토 제거 및 토공
	청성 ~심천	17.5	8,049	확12.1 포 8.9	4,488	확 2.3 포 5.9	1,200	30	토공
	목정 ~용화	20.0	9,399	확10.8 포10.8	4,656	확 1.2 포 0.4	1,100	28	표토 제거 및 토공

※ ()는 남한강대교 강원도 부담금 포함 ['93 : 1,120백만원, '94 : 1,394백만원]

사 업 명		전 체		기 투 자		'94 계 획		추 진 실 적	
		사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	진도	추 진 내 용
2 차 선	쌍촌 ~홍덕	12.9	7,327	확10.0 포 2.0	3,580	교 1 포 1.6	1,298	33	표토제거 및 토공
	덕산 ~이월	13.8	5,121	확13.5 포10.0	4,169	확 0.3 포 3.8	952	35	토공및구조물
	쌍곡 ~관평	12.8	6,077	확 9.7 포 9.0	4,107	확 2.1	1,100	25	표토제거 및 토공
	문광 ~관평	8.3	5,385	확 4.4 포 3.0	2,690	포 1.3	300	38	토공및구조물
	장연 ~ 수안보	6.9	6,118	확 3.8 포 4.4	3,161	1.9	1,291	37	토공및구조물
	원남 ~맹동	16.2	6,167	확13.4 포13.1	4,515	확 1.8	1,000	27	표토제거 및 토공
	대소 ~맹동	10.8	5,953	확10.8 포 4.7	5,089	포 6.1	864	50	보조기충포설
	금왕 ~덕산	10.0	5,955	확 1.5	777	확 2.3 포 1.5	890	31	토공및구조물
	금왕 ~율면	7.6	4,193	확 1.9	660	확 1.3 포 0.5	680	15	표토제거 및 토공
	생극 ~일죽	7.8	3,524	6.8	2,824	1.0	700	-	경기도시행 (발주준비중)
	양성 ~점동	0.9	1,481	-	-	0.9	1,481	30	표토제거 및 토공
	구단양 ~방곡	17.9	6,581	확17.9 포13.2	5,948	포 4.7	633	85	포장및구조물
	제천 ~ 어상천	9.0	7,800	확 1.8 포 1.0	962	확 3.1 포 1.1	1,310	20	토공및구조물
	어상천 ~별방	7.5	4,320	확 1.5	583	확 0.6 포 1.5	710	28	표토제거 및 토공
	대강 ~예천	10.9	4,314	확10.9 포 8.9	3,814	포 2.0	500	34	토공및구조물

(3) 군도 확 · 포장사업

□ 군 시행사업

(단위 : km, 백만원)

군 별	노선	총 계		기 투 자		'94 계 획		추 진 실 적	
		사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	진도	추 진 내 용
계	108	1,151.3	412,668	675.7	208,975	116.0	53,384	30%	
청원군	18	146.7	55,487	87.3	31,330	13.7	6,331	35	토공및구조물 시공중
보은군	14	120.0	38,186	70.9	16,167	12.6	5,782	40	"
옥천군	5	48.9	15,667	29.9	7,826	4.5	2,060	30	"
영동군	11	112.7	44,682	62.5	22,089	12.9	5,907	35	"
진천군	5	53.7	24,471	22.0	11,025	7.7	3,521	25	"
괴산군	13	104.2	33,853	64.5	19,231	8.3	3,834	35	"
음성군	9	77.4	27,250	43.0	11,911	8.7	4,021	30	"
증원군	11	198	57,563	140.8	36,906	11.8	5,420	32	"
제천군	10	154	64,493	78.1	29,054	20.0	9,278	30	"
단양군	10	115.7	42,212	68.0	19,706	12.9	5,907	20	"
증평 출장소	2	20	8,804	8.7	3,730	2.9	1,323	30	"

(4) 농어촌도로 확 · 포장사업

□ 군 시행사업

(단위 : km, 백만원)

군 별	노선	총 계		기 투 자		'94 계 획		추 진 실 적	
		사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	진도	추 진 내 용
계	1,290	3,457.0	600,074	878.9	108,149	40.3	9,674	35%	
청원군	171	438.5	74,599	140.9	15,854	4.3	1,117	30	토공및구조물 시공중
보은군	92	205.9	36,324	44.2	5,745	3.2	607	40	"
옥천군	94	298.6	43,761	133.6	13,044	2.3	619	90	"
영동군	85	266.5	45,715	74.7	8,057	3.7	720	45	"
진천군	90	262.3	41,175	88.6	9,586	2.3	652	25	"
괴산군	108	307.0	56,150	69.7	10,624	4.1	890	30	"
음성군	104	376.0	67,095	71.0	10,162	5.0	1,144	35	"
증원군	239	502.1	82,412	154.3	18,634	4.3	1,305	30	"
제천군	147	402.4	78,471	56.5	10,544	5.5	1,298	30	"
단양군	142	348.4	66,006	35.5	5,538	5.0	1,174	20	"
증평 출장소	18	49.3	8,364	9.9	361	0.6	148	90	마무리정리중

(5) '94시군 보조사업

□ 군 시행사업

(단위 : KM, 백만원)

사 업 명	전 체		기 시 행		'94 계 획		추 진 실 적	
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	진도	추진내용
계	28건	26,485	7건	5,370	28건	10,175	10%	
충주 칠지마을 도로개설	0.63	200			0.63	200	-	추경예산 확보
청원 계원-원평간 도로확포장	3.0	750	-	-	2.0	500	35	토공시공중
청원 하석-노산간 도로확포장	0.3	50	-	-	0.3	50	-	추경예산 확보
청원 화원리 농로 확포장	0.7	50	-	-	0.7	50	-	추경예산 확보
보은 판장-조곡간 땀주변도로확포장	3.0	600	-	-	3.0	600	-	용지보상중
육천 육천-동이간 통로박스접속도로	암거24도 0.3	1,600	암 거 24 M	1,200	0.24	400	30	접속도로 암거시공
육천 원동-구탄간 도로확포장	2.5	700	1.0	300	1.5	400	30	토공및구조물시공
육천 현리-월외간 우회도로	도0.21교0.04	360	-	-	도0.16교0.04	360	50	토공및구조물시공
영동 황간교접속 도로	0.3	400	-	-	0.3	400	-	용지보상
영동 역파-이수국 교간도로확포장	2.5	500	-	-	2.5	500	80	포장공사중
영동 설계리 농로 확포장공사	0.45	45	-	-	0.45	45	-	추경예산 확보
괴산 조곡-하문간 도로교량가설	도0.98교0.15	1,250	교 량 하 부	400	상 부 도0.98	600	90	접속도로 시공중
괴산 선평리 마을 진입로포장	0.6	60			0.6	60	-	추경예산 확보
음성 오류-내산간 도로확포장	8.0	2,300	-	-	1.2	500	15	토공공사중

사 업 명	전 체		기 시 행		'94 계 획		추 진 실 적	
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	진도	추진내용
중원 대소-가정간 도로확포장	7.2	2,270	3.5	790	3.5	800	30	구조물시공중
중원 양촌-북탄간 도로확포장	5.1	3,550	0.7	400	1.5	750	25	토공공사중
중원 살미 토계 진입로확포장	0.9	50	-	-	0.9	50	-	추경예산 확보
중원 신니 방추 진입로확포장	0.72	50	-	-	0.72	50	-	추경예산 확보
중원 노은 도로 정비	0.4	338	-	-	0.4	160	-	추경예산 확보
제천 청풍관광광지변 정비(청풍-매포)	8.3	3,380	1.5	900	2.0	500	30	토공및구조물시공
제천 봉화-덕곡간 도로확포장	1.5	500	-	-	1.5	500	70	선택충및구조물
제천 단리-도전간 도로확포장	10.8	2,462	-	-	3.0	400	15	토공시공중
제천 옥전과선교 개축공사	0.45	400	-	-	0.45	400	60	교각시공중
제천 덕곡-연륜간 도로확포장	4.6	1,000	-	-	2.3	500	-	추경예산 확보
제천 송학 안말 도로확포장	0.7	300	-	-	0.7	300	60	추경예산 확보
단양 청풍관광광지변 정비(매포-청풍)	6.6	2,720	1.4	1,380	1.0	500	30	토공공사중
단양의풍도로확포장공사(김삿갓묘)	2.5	500	-	-	2.5	500	20	"
단양 고수-곰말간 도로정비	1.1	100	-	-	1.1	100	100	완 공

4. 철도건널목 개량

□ 사업개요

○ 대상 : 7개소

· '94 계획 : 4 개소 (계속사업)

· 향후계획 : 3 개소 (어상천, 삼원, 회동)

□ 추진계획

(단위 : 백만원)

구분 명칭	위 치	사업량	시행 기간	총 사업비	기 투 자	'94 사업비	추진 실적	
							진도	추진내용
계	7 개소			38,766	3,636	7,711	16%	
마암	옥천군 옥천읍	과선교 100 M	'92 ~'94	2,707	2,496	211	65	강교 설치중
옥산	청주시 정봉동	과선교 130 M	'93 ~'94	2,400	220	2,180	-	도시계획 변경중
심천	영동군 심천면	과선교 150 M	'93 ~'94	2,475	460	2,015	20	구조물(옹벽) 시공중
양산	옥천군 이원면	지하도 37 M	'93 ~'94	4,884	460	3,305	20	접속도로 토공 시공중
어상천	제천시 동현동	과선교 950 M	'94 ~'95	7,800	-	-	-	'95 이후 시공
삼원	충주시 철금동	과선교 600 M	'94 ~'95	17,500	-	-	-	"
회동	영동군 황간면	과선교 40 M	'96 ~'97	1,000	-	-	-	"

5. 노후교량 보수(지방도)

□ '94 사업개요

13 개소

5,650 백만원

- 도 비 사 업	9 "	2,700 "
- 양 여 금 사 업	3 "	2,920 "
- 안전진단 용역	1 "	30 "

□ 도비사업

(단위 : M/ 백만원)

사 업 명	총 계		' 9 4		추진 실적		비 고
	사업량	사업비	사업량	사업비	진도	추진 내용	
계	10	3,370	9	2,700	38%		
덕동대교	L= 100 B= 9.5	1,000	L= 100	500	-	용역설계중	개축(계속사업)
신 흥 교	L= 25 B= 9.5	170			-		개축('95시행)
송 면 교	L= 30 B= 9.5	200	L= 30 B= 9.5	200	90	스라브 완료 접속도로시공중	
남 천 교	L= 33 B= 9.5	210	L= 33 B= 9.5	210		용역설계중	개축
미 호 교	L= 432 B= 9.5	1,500	L= 432 B= 9.5	1,500	15		개축(충남시행)
산 계 교	L= 240 B= 7.5	110	L= 240 B= 7.5	110	90	이음장치및교좌 장치보수완료	보수
용 압 교	L= 130 B= 7.5	80	L= 130 B= 7.5	80	100	교각및이음장치 보수완료	"
미잠 2교	L= 77 B= 8.0	50	L= 77 B= 8.0	50	100	기초보강,이음 및교좌장치보수	"
신 효 교	L= 60 B= 7.5	20	L= 60 B= 7.5	20	100	교좌장치보수완 료	"
노 천 교	L= 72 B= 8.0	30	L= 72 B= 8.0	30	100	이음장치및상판 보수완료	"

□ 양여금사업

(단위 : M/ 백만원)

사 업 명	총 계		' 9 4		추 진 실 적		비 고
	사업량	사업비	사업량	사업비	진도	추 진 내 용	
계	3 개소	8,100	3 개소	3,300	13%		
호 탄 교	L= 300	3,900	하부 97기	1,000	15	가설공사 완료	
쌍 청 교	L= 297	3,200	하부 67기	1,300	10		
황 간 교	L= 72	1,000	L= 72	1,000	15	기초 터파기	

도로관리사업소 운영

1. 기 본 현 황
2. 교통안전시설 정비
3. 지방도 유지보수
4. 충주지소 이전계획 추진

1. 기본현황

□ 위치 및 면적

구 분	위 치	면적 (㎡)		근무인원 (명)
		대 지	건 물	
계		15,866	1,812	95
본 소	청주시 주중동 155 - 7	10,785	1,018	67
충 주 지 소 (임시 이전)	충주시 용탄동 1137	4,142	600	19
육천 작업반	육천군 육천읍 삼양리	939	194	9

□ 보유장비

계 51 대

○ 사리도 보수용 : 20 대

· 덤프 7 · 로우더 3 · 구레이더 4
· 굴삭기 2 등

○ 포장도 보수용 : 17 대

· 로울러 4 · 혼합기 3 · 파쇄기 4
· 다짐기 4 등

○ 기타 사업추진용 : 14 대

· 불도저 1 · 화물차 4 · 트레일러 1 등

2. 교통안전시설 정비

□ 사업개요

- 대 상 : 도내일원
- 사업량 : 지방도 43 노선, 937 km
- 사업비 : 1,565 백만원
- 사업기간 : '94. 1 ~ '94. 12

□ 추진상황

(단위 : 백만원)

구 분	계 획		실 적		진도	비 고
	사 업 량	사 업 비	사 업 량	사 업 비		
계	6 종	1,565	6 종	1,095	70%	
미끄럼 방지	9개소/6.4 km	181	7개소/4.9 km	143	79	
방음벽 설치	2개소/0.2 km	100	1개소/0.06km	29	29	
낙석 방지책	9개소/1.5 km	421	6개소/1.1 km	243	58	
위험도로개량	1개소/0.72km	500	1개소/0.52km	454	91	
차 선 도 색	765 km	163	553 km	117	72	
표지판 정비	200개소	200	95개소	109	55	

3. 지방도 유지보수

□ 사업의 필요성

- 교통사고 방지 및 원활한 교통소통

□ 사업 개요

- 대 상 : 도내일원
- 사업량 : 지방도 43 노선, 937 km
- 사업비 : 1,398 백만원
- 사업기간 : '94. 1 - '94. 12

□ 추진 상황

(단위 : 백만원)

구 분	계 획		실 적		진도	비 고
	사 업 량	사 업 비	사 업 량	사 업 비		
계	5 종	2,029	5 종	1,101	54%	
사리도유지보수	109 km	-	65 km	-	56	
포장도유지보수	6개소/13.3 ^{km}	400	4개소/ 8.8 ^{km}	222	56	
제 설 작 업	937 km	-	937 km	-	100	
구 조 물 정 비	14개소/5.5 ^{km}	298	13개소/5.1 ^{km}	236	79	
위험 교량 보수	7 개소	1,331	10 개소	643	48	

4. 충주지소 이전 추진

□ 현 황

- 위 치 : 충주시 용탄동 1137 - 1 번지
- 사업 규모 : 지하 1층, 지상 2층
 - 부지면적 : 1,200 평
 - 건물면적 : 387 평
 - 동 수 : 본관 1동, 차고 1동
 - 구 조 : 철근콘크리트슬라브, 경량철골조

□ 추진상황

- 본관동 : 1층 슬라브 콘크리트 타설, 2층 거푸집 조립중
- 차고동 : 골조 및 벽돌쌓기 완료

□ 향후계획

- '94 10월초 입주예정

지 역 현 안 사 업

1. 충주광역상수도 사업추진
2. 대청광역상수도 2단계사업추진
3. 중앙고속도로 건설
4. 중부내륙고속도로 건설
5. 국도4차선 확 포장

1. 충주댐광역상수도 사업추진

□ 사업 개요

- 시설 용량 : 250 천톤 / 일
- 급수 구역 : 충주, 증원, 음성, 진천, 괴산군 (5 개시군 31 도시)
- 사업비 : 850 억원
(통합 정수장 건설비 지방비 분담액 310 억원추정)
- 사업기간 : '93 ~ '97

□ 추진 상황

- 기본설계 용역 발주 ('93. 10. 25)
- '94 예산 29 억 (실시설계 및 용지매수) 반영
- 급수구역 확정후 세부설계 실시중

□ 추진 계획 및 전망

- 실시설계 완료. 사업착공 ('94)
- 사업 시행 ('95 ~ '97)

2. 대청광역상수도 2단계사업

□ 사업 개요

- 시설 용량 : 400 천톤 / 일
- 급수 구역 : 청주, 천안, 온양등 34 개지역
- 사업비 : 900 억원
- 사업기간 : '95 ~ '98

□ 추진 상황

- 조기추진 건의 (도) '95 ~ '98 → '94 ~ '97
- '94 예산에 기본조사 설계비 7 억 반영
- 기본설계 용역 발주 ('94. 5. 4)

□ 추진 계획 및 전망

- 기본설계 ('94)
- 실시설계 ('95)
- 사업 시행 ('96 ~ '98)

3. 중앙고속도로 건설

□ 사업개요

- 위 치 : 춘천 ~ 제천 ~ 대구 (충북 제천. 봉양 ~ 단양. 대강)
- 사업규모 : 280 km (충북 60km) ⇒ 4 차선 전제 2 차선시공
- 사업기간 : 1989 ~ 2004 (16개년)
- 시 행 청 : 건설부

□ 투자계획

(단위 : km, 억원)

세 부 사업명	사업량	총사업비	'93 까지 투 자	'94 계 획				'95 이후
				소 계	국 비	지방비	기 타	
계	280km (60)	33,192	5,706	2,400	2,400	-	-	25,086
1 단계	151.0 (9.9)	14,535	5,606	2,050	2,050	-	-	6,879
2 단계	129.0 (50.1)	18,657	100	350	350	-	-	18,207

※ () 내는 충북구간

□ 추진상황

- 1단계사업 : 151.0(9.9)km 토공 및 구조물 시공중
 - 진 도 : 63%(제천-원주간 : 86%)
- 2단계사업 : 129.0(50.1)km '94부터 용지보상 및 착공

□ 향후전망

- 1 단계 : 2차선 '95 완공 예정
- 2 단계 : '94부터 보상 및 착공 → 2004년 완공예정

4. 중부내륙고속도로 건설

□ 사업개요

- 위 치 : 여주 ~ 충주 ~ 구미 (충북 음성. 감곡 ~ 충북 괴산. 연풍)
청주 ~ 보은 ~ 상주 (충북 청원. 척산 ~ 충북 보은. 관기)
- 사업규모 : 234.7 km (충북 106 km)
- 사업기간 : 1997 ~ 2004 (8 개년)
- 시 행 청 : 건설부

□ 투자계획

(단위 : km, 억원)

세 부 사업명	사업량	총사업비	93까지 투 자	'94 계 획				'95 이후
				소 계	국 비	지방비	기 타	
계	234.7km (106)	13,785	74	-	-	-	-	13,711
여주~충주 ~구미	154.0 (64)	7,238	54	-	-	-	-	7,184
청주~보은 ~상주	80.7 (42)	6,547	20	-	-	-	-	6,527

※ () 내는 충북구간

□ 추진상황

- 여주 - 충주 - 구미 구간 (154.0 KM)
 - . 기본설계 완료 ('88)
 - . 실시설계 : 68.4 KM (장호원 - 충주간 25.0 KM) 완료
- 청주 - 보은 - 상주 구간 (80.7 KM)
 - . 기본설계 완료 ('91)
 - . 실시설계 13.4 KM (척산 - 가덕간) 완료

□ 향후전망

- 중앙계획에 의거 '97. 이후 착공 예정

5. 국도4차선 확 · 포장

□ 사업내역

(단위 : km, 억원)

사업명	전 체		기 루 자		'94 계 획		추 진 실 적	
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	진도	추 진 내 용
계	6/ 171.4 교량 9	6,115	확35.3 포13.0 교량 1	1,340	확20.4 포13.1 교량 4	551	25.6 %	
충주~봉양	29.5 교량 2	1,533	확 8.1 교량 1	356	확 2.3 교량 1	152	43.0	목행교하부공사 박달재터널공사
옥천~영동	26.7 교량 3	914	확 5.8 포 1.0	253	확11.9 포 3.7 교량 3	296	23.5	토공작업중 양강교상부공사
장호원 - 수안보	53.8 교량 4	1,467	보상	18	확 6.2	103	5.9	토공작업중 달천교하부공사
청주~진천	25.3	890	-	-	-	-		청주~오창간 (9.0KM) 실시설 계용역발주중
제천 - 신단양	26.9	911	확21.4 포12.0	713	포 9.4	(366)	(76)	93이월공사(제 천~매포) 소교량 및 포장
제천~송학	9.2	400	-	-	-	-		제천~송학간 (9.2 KM) 실시설 계용역발주중

□ 추진상황

○ 충주~봉양

- 충주~송강(L=10.5km) : 확장(2.2KM)토공작업중, 목행대교소(700M)하부공사중
- 송강~백운(L= 8.8km) : 실시설계 미착수, 다릿재(2.2KM) '94하반기 실시설계
건설부에 건의중
- 백운~연박(L= 6.4km) : 박달재터널(1.96KM)2차선 굴진완료(내부공사중)
- 연박~봉양(L= 3.8KM) : 실시설계용역중(원방종합기술공사, '94. 5. 6~12. 31)

○ 옥천~영동

- 옥천-고당(L= 17.0KM) : 확장(10.0KM)토공작업중, 소교량 5개소 상부공사중
- 고당-영동(L= 9.7KM) : 확장(1.9KM)토공작업중, 양강교(300M) 상부공사중

○ 장호원~수안보

- 장호원~생곡(L=11.5KM) : 실시설계 미착수
 - 생곡~주덕(L=20.5KM) : 실시설계용역중(삼우기술단, '94. 5. 6~12. 31)
 - 주덕~충주(L=12.5KM) : 국도중용구간완공(청주~충주4차선도로 완공)
 - 충주~상모(L= 9.5KM) : 확장(3.2KM) 토공작업중, 탈천교 2개소 하부공사중
 - 상모~수안보(L=8.5KM) : 확장(3.0KM) 토공작업중, 배수구조물 공사중
- ※ 충주시 우회도로 구간 4.3KM 포함.

○ 청주~진천

- 옥천-오창(L= 9.0KM) : 실시설계용역중(삼안기술공사, '94. 5. 23~12. 31)
- 오창-진천(L= 16.3KM) : 실시설계 미착수

○ 제천~신단양

- 제천-매포(L= 21.4M) : 12.0KM 확.포장 완료, 소교량 및 포장공사중 ('93 이월사업)
- 매포-신단양(L=5.5KM) : 실시설계용역중(홍익기술단, '94. 5. 4~10. 30)

○ 제천~송학

- 제천-송학(L= 9.2KM) : 실시설계용역중(삼우기술단, '94. 5. 25~12.31)

□ 향후전망

- '94 하반기 실시설계 용역발주
 - 충주-봉양구간중 다릿재터널(2.2KM)
- '95 착공예정
 - 장호원-수안보구간중 생곡-주덕간(20.5KM)
 - 청주-진천구간중 청주-오창간(9.0KM)
 - 매포-신단양(5.5KM)
 - 제천-송학(9.2KM)

도정 질문중 계속사업추진상황

1. 청주~보은~상주간 중부내륙 고속도로 건설 추진상황 및
국도 4 차선 확포장사업추진 (이 광 호 의원)
2. 월악산과 소백산 국립공원내 집단 취락지구 불편 해소
방안과 공원 재조정 시기 (이 병 규 의원)
3. 리라병원앞→공항입구→고속도로까지 4~6차선 계획
(김 준 석 의원)
4. 교량 안전진단 결과 조치사항 (봉 하 용 의원)

1. 청주-보은-상주간 중부내륙 고속도로 건설 추진상황 및 국도 4 차선 확포장 사업추진

질문일자	'92. 6. 16 (제79차)	질문장소	본 회 의 장
질문의원	내무위 이광호 의원	답 변	건설도시국장

□ 질문내용

- 청주-보은-상주간 중부내륙 고속도로 건설 추진상황 및
- 국도 4 차선 확포장사업추진 상황은 ?

□ 답변내용

가. 청주-보은-상주간 중부내륙고속도로 사업추진

- 개 요
 - 총연장 : 80.7 km (충북 42 km)
 - 사업비 : 2,674 억원
- '91년도 10억원의 예산으로 전구간 타당성 조사 및 기본설계 완료
- '92년도 건설부에서 본구간에 대한 기본계획을 검토중에 있어 중앙부처와 협의 조기 착공 되도록 노력 하겠음

나. 청주-보은-상주간 국도4차선 확포장 사업추진

- 교통량이 많은 구간부터 순차적으로 확포장 추진되도록 노력 하겠음

□ 현재까지의 처리상황

가. 청주-보은-상주간 중부내륙고속도로 사업추진 상황

- '91 타당성 조사 기본설계 완료
- '92 척산- 문의-가덕간 13.4 KM 실시설계완료
- '94 예산확보를 위하여 '93.2.24 이후 당정협의 및 건설부등에 건의
- '94.5월 서울에서 지역국회의원등 당정협의 및 현재까지 서면건의 6회, 방문건의 11회를 한바 있음

나. 청주-보은-상주간 국도4차선 확포장 사업추진

○ 청주~피반령~보은간 국도

- 청주-남일간 6.7km 4차선 : 90 완공
- 남일-두산간 3.4 " 4차선 : 93 완공
- 두산-보은간 25.2 " 2차선 : 92 완공

○ 청주~미원~보은간 국도

- 두산-미원간 13.2 KM 4차선 용지보상 추진(6.8 KM 260억원)

※ 미원-보은간 : 26 KM는 교통량이 1일 8,000대 미만으로 4차선 확.포장계획 없음

2. 월악산과 소백산국립공원내 집단취락지구 불편해소 방안과 공원 재조정 시기

질문일자	'93. 5. 13(제89차)	질문장소	본 회의장
질문의원	건설위 이병규 의원	답변	건설도시국장

□ 질문내용

- 월악산과 소백산 국립공원내 집단취락지구 불편 해소방안과 공원 재조정 시기

□ 답변내용

- 공원현황

구분	계	월악산	소백산
지정일적 면적	605.0km ²	84.12.31 284.5	87.12.14 320.5

- 취락지구 현황

[월악산 소백산]	계	21개 부락	4.03 km ²
	월악산	20개 부락	3.99 "
	소백산	1개 부락	0.04 "
- 취락지구내 가능시설
 - 100m² 이하의 신축과 기존건물 100m²이하의 증.개.재축, 의원, 약국,
 - 이.미용원, 상점설치 운영이 가능하도록 규정되어 있음
- 공원 재조정 시기 : 공원계획은 공원지정하고 10년 마다 재조정토록 되어 있음.
- 공원에 편입되어 있는 집단 취락지역의 제척문제등을 종합검토하여 내무부에 건의

□ 현재 까지 처리상황

- '93. 9. 18 공원경계조정 및 공원계획변경 건의(충북도→내무부)
 - 경계조정(2,947천m²), 공원계획변경(335천m²) — 자연환경지구→취락지구
- '93. 10. 8 공원경계조정 지난 회신(내무부→충북도)
 - 공원계획변경(자연환경지구→취락지구)은 정밀재조사후 신청토록 회신
- '94. 2. 8 공원계획변경 건의(충북도→내무부)
- '94. 4. 1 공원계획변경 재검토 회신(내무부→충북도)
- '94. 6현재 공원계획변경을 위하여 국립공원관리사무소와 협의중

3. 리라병원앞 → 공항입구통과 고속도로까지 4-6차선 확·포장, 개항전 완공 대책

질문일자	'93. 9. 16 (제94차)	질문장소	본 회 의 장
질문의원	기경위 김준석 의원	답 변	도 지 사

□ 질문내용

- 리라병원앞에서 공항입구를통과 고속도로 IC까지 4-6차선으로 공항 개항전까지 완공되어야 하는데 이에 대한 계획

□ 답변내용

- 청주-오창간 4차선확장
 - 사 업 량 : L = 9.0 KM(B = 18.5 M)
 - 사 업 비 : 315억원
 - 시행기간 : '94~'95
 - 시 행 청 : 건설부
- ※ 중앙 관련부처에 계속 건의하여 시행토록 노력하겠음

□ 현재까지의 추진내용

- 관련부처에 조기사행 건의 : 17회(서면건의 6, 방문건의 11)
- 청주-오창(9.0 KM) 실시설계 용역발주중('95 착공 예정)
 - 용역기간 : '94. 5. 23 - 12. 31
 - 용역업체 : 삼안기술공사
 - 용 역 비 : 348 백만원

※ 지역현안사업으로 책정 조기에 완공될 수 있도록 중앙부처에 계속 건의중

4. 교량안전 진단결과 조치사항

질문일자	'93. 9. 17 (제94차)	질문장소	본 회 의 장
질문의원	건설위 봉하용 의원	답 변	건설도시국장

□ 질문내용

- 도내 교량의 안전진단 결과 (30년이상 노후교량, 100m 길이교량) 및 조치사항은

□ 답변내용

- 도 관내 고속도로 및 국도 368개소, 지방도 272개소, 시군도 488개소등 총 1,088개소
- 보수 및 개축을 요하는 교량은 국도 74개소 지방도 53개소, 시군도 47개소 등 총 174개소
- 위험이 있다고 판단되는 교량 국도 2개소, 지방도 4개소, 군도 1개소에 대하여
현재 통행제한을 실시하고 그중 6개소 교량은 금년내에 설계를 완료해서 '95년까지
제시공이 될 수 있도록 용역발주중
- 보수대상 교량 총 174개소중 노후상태가 심한 103개 교량은 금년말까지 보수
완료계획
- 71개소는 년차적으로 보수, 개선할 계획임

□ 현재까지의 추진내용

- 위험이판단되는 교량 : 7개소
 - 통행제한실시 : 7개소
 - 7개소중 1개소(장호원교)는 완료, 6개소는 '94 시공중
- 보수대상 교량 : 174개소
 - '94 까지 : 152개소

E	완	료	114
	공	사	27
	설	계	11
 - 향후계획 : 22 개소 재점검 결과에 따라 우선순위를 결정 년차적으로 시행
· 사업의 시급성에 따라 우선순위를 결정하여 년차적으로 시행
 - 추진사항

E	완	료	86
	공	사	12
	예산미확보	5(국도)	
 - 향후계획 : '93.10월 재점검 결과에 따라 우선순위를 결정 년차적으로 시행
